

**Акт**  
**по результатам контрольного мероприятия**  
**«Проверка расходования бюджетных средств в ходе реализации**  
**национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех**  
**каждого ребенка» в Муниципальном общеобразовательном учреждении**  
**средняя школа № 2 р. п. Новоспасское»**

р.п. Новоспасское

«02» июня 2023 года

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования «Новоспасский район», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2021г № 39/131, план работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Новоспасский район» на 2023г.

**Цель контрольного мероприятия:** проверка законности и результативности использования бюджетных средств в ходе реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя школа № 2 р. п. Новоспасское.

**Предмет контрольного мероприятия:** законодательные, нормативные правовые и иные распорядительные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные первичные документы.

**Объект контрольного мероприятия:** Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 р. п. Новоспасское (далее – МОУ СШ № 2 рп Новоспасское).

**Форма, метод и вид контрольного мероприятия:** проверка сплошным методом.

**Проверяемый период деятельности:** 2022 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 10 мая по 02 июня 2023 года.

**Сумма проверенных средств составила:** 2 929,2 тыс. рублей.

**Краткая характеристика проверяемого объекта.**

Юридический адрес: 433870, Ульяновская область, Новоспасский район, рп Новоспасское, ул. Мира, д. 37.

В проверяемом периоде директором школы являлась Аракчеева Татьяна Александровна (приказ № 89-к от 01.09.2011г. о назначении директора), главным бухгалтером – Рыськова Ольга Николаевна (приказ № 14 от 26.09.2012г. о приеме на должность главного бухгалтера).

Распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области № 1671-р от 11.08.2022г. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 рп Новоспасское включена в перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Ульяновской области для реализации мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» государственной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П.

**В ходе проверки установлено следующее:**

Проанализированы бухгалтерская, финансовая отчетность, документация по освоению бюджетных средств на реализацию национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта "Успех каждого ребёнка" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" государственной программы Ульяновской области "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" в МОУ СШ № 2 рп Новоспасское при ремонте спортивного зала, раздевалок, входной группы спортивного зала.

Муниципальным общеобразовательным учреждением средняя школа № 2 рп Новоспасское из бюджетов всех уровней получены субсидии на общую сумму 2 929 248,95 руб. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ульяновской области бюджету Новоспасского муниципального района в соответствии с Соглашением № 73629000-1-2022-001/1 от 06.10.2022г., исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 75,0%, составляет в 2022 году 2 196 936,71 руб.

На перечисленные суммы субсидии выполнены работы по ремонту спортивного зала, мужской и женской раздевалок, входной группы спортивного зала, а также закуплен спортивный инвентарь.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» заключено 5 договоров (1 на основании торгов и 4 прямых) на общую сумму 2 929 248,95 руб.

По итогам торгов заключен 1 **муниципальный контракт** на сумму 1 556 496,35 руб.:

1. Контракт на выполнение работ № 12 от 27.06.2022г., ИКЗ 223731300307373130100100100004399244 на сумму 1 556 496,35 руб. Предмет контракта – выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в МОУ СШ № 2 рп Новоспасское Ульяновской области. Подрядчик – Индивидуальный предприниматель Артамонов Евгений Александрович

ИНН 470317854913. Источник финансирования – средства федерального, регионального, местного бюджета муниципального образования «Новоспаский район» Ульяновской области на 2022г.

Заключено 4 (четыре) прямых договора на общую сумму 1 372 752,60 руб.:

№ пп	Дата, номер договора	Предмет договора	Сумма договора, руб.	Поставщик, исполнитель
1	Контракт на выполнение работ № 15 от 30.06.2022г.	Выполнение работ по текущему ремонту входной группы в спортивный зал в МОУ средняя школа № 2 рп Новоспаское	515 205,00	ИП Артамонов Е.А. ИНН 470317854913
2	Контракт на выполнение работ № 16 от 30.06.2022г.	Выполнение работ по текущему ремонту раздевалок спортивного зала в МОУ средняя школа № 2 рп Новоспаское	364 246,80	ИП Артамонов Е.А. ИНН 470317854913
3	Контракт на выполнение работ № 17 от 30.06.2022г.	Выполнение работ по текущему ремонту полов в спортивном зале в МОУ средняя школа № 2 рп Новоспаское	148 582,80	ИП Артамонов Е.А. ИНН 470317854913
4	Контракт на поставку товара № 39 от 09.09.2022г.	Закупка и поставка спортивного оборудования для нужд МОУ СОШ № 2 рп Новоспаское	344 718,00	ООО «Чемпион» ИНН 6325047884

*В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения норм Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:*

#### 1. Контракт на выполнение работ № 12 от 27.06.2022г.

- Предмет контракта – выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в МОУ СШ № 2 рп Новоспаское Ульяновской области;
- Подрядчик – ИП Артамонов Е.А. ИНН 470317854913;
- Сумма контракта – 1 556 496,35 руб. (имеется дополнительное соглашение от 24.10.2022г., которым внесены изменения в пункт 3.1 контракта и срок выполнения работ увеличен с 18.07.2022г. до 30.11.2022г.).

В рамках указанного контракта выполнены работы по текущему ремонту потолка, стен, пола спортивного зала, осуществлена замена дверей, обновлена электрика.

Пунктом 5.1 Контракта № 12 от 27.06.2022г. предусмотрено, что сдача результата работ или промежуточных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются структурированным документом о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), подписанным обеими сторонами.

В ЕИС содержатся сведения о том, что работы были приняты в 2 этапа, при этом составлены акты о приемке выполненных работ:

- № 1 от 19.07.2022г., исправление № 1 от 20.09.2022г. на сумму 693 016,95 руб. Указанный акт подписан со стороны Заказчика директором школы Аракчеевой Т.А. электронной цифровой подписью 11.10.2022г.;
- № 2 от 25.11.2022г. на сумму 863 479,40 руб. Указанный акт подписан со стороны Заказчика директором школы Аракчеевой Т.А. электронной

### цифровой подписью 28.11.2022г.

Таким образом, результат работы принят Заказчиком 11.10.2022г. и 28.11.2022г. – даты подписания структурированного документа о приемке.

Пунктом 2.5 указанного контракта предусмотрено, что оплата выполненных работ по контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке в ЕИС.

В нарушение статей 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вышеуказанный контракт в части работ, принятых Актом № 1 от 20.09.2022г., оплачен с нарушением сроков, установленных контрактом:

Сумма договора, руб.	Дата приемки	Срок оплаты по договору (п. 2.5 контракта)	Крайний срок оплаты	Фактическая дата оплаты (номер, дата платежного поручения)	Сумма оплаты, руб.	Количество просроченных дней
1 556 496,35	11.10.2022	В течение 7 рабочих дней с даты подписания структурированного документа	19.10.2022	№ 883 от 24.10.2022	693 016,95	3
	28.11.2022		06.12.2022	№ 1002 от 28.11.2022	863 479,40	0
Итого:					1 556 496,35	

**Сумма нарушения составила 693 016,95 руб.**

#### 1. Контракт на выполнение работ № 15 от 30.06.2022г.

- Предмет контракта – выполнение работ по текущему ремонту входной группы в спортивный зал в МОУ СШ № 2 рп Новоспасское Ульяновской области;
- Подрядчик – ИП Артамонов Е.А. ИНН 470317854913;
- Сумма контракта – 515 205,00 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № АКТ-1 от 31.08.2022г., на сумму 515 205,00 руб. со стороны заказчика подписан директором школы Аракчеевой Т.А.

В рамках указанного контракта выполнены работы по текущему ремонту потолка, стен, пола, осуществлена замена дверей, электрики входной группы в спортивный зал.

#### 2. Контракт на выполнение работ № 16 от 30.06.2022г.

- Предмет контракта – выполнение работ по текущему ремонту раздевалок спортивного зала в МОУ средняя школа № 2 рп Новоспасское;
- Подрядчик – ИП Артамонов Е.А. ИНН 470317854913;
- Сумма контракта – 364 246,80 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № АКТ-1 от 31.08.2022г., на сумму 364 246,80 руб. со стороны заказчика подписан директором школы Аракчеевой Т.А.

В рамках указанного контракта выполнены работы по ремонту потолка, стен, пола, осуществлена замена дверей, электрики мужской и женской

раздевалки спортивного зала.

**3. Контракт на выполнение работ № 17 от 30.06.2022г.**

- Предмет контракта – выполнение работ по текущему ремонту полов в спортивном зале в МОУ средняя школа № 2 рп Новоспасское;
- Подрядчик – ИП Артамонов Е.А. ИНН 470317854913;
- Сумма контракта – 148 582,80 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ № АКТ-1 от 31.08.2022г., на сумму 148 582,80 руб. со стороны заказчика подписан директором школы Аракчеевой Т.А.

В рамках указанного контракта выполнены работы по ремонту пола спортивного зала, не предусмотренные Контрактом на выполнение работ № 12 от 27.06.2022г.

Пунктом 2.5. Контрактов № 15, 16, 17 от 30.06.2022г. предусмотрено, что оплата выполненных работ производится путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке.

В нарушение статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вышеуказанные контракты оплачены с нарушением сроков, установленных контрактами:

Дата, номер договора	Сумма договора, руб.	Дата приемки	Срок оплаты по договору (п. 2.5 контракта)	Крайний срок оплаты	Фактическая дата оплаты (номер, дата платежного поручения)	Сумма оплаты, руб.	Количество просроченных дней
№ 15 от 30.06.2022г.	515 205,00	31.08.2022	в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке	08.09.2022	№ 884 от 24.10.2022	515 205,00	32
№ 16 от 30.06.2022г.	364 246,80	31.08.2022		08.09.2022	№ 885 от 24.10.2022	364 246,80	32
№ 17 от 30.06.2022г.	148 582,80	31.08.2022		08.09.2022	№ 886 от 24.10.2022	148 582,80	32
Итого:						1 028 034,60	

**Сумма нарушения составила 1 028 034,60 руб.**

**Итого сумма нарушения составила 1 721 051,55 руб.**

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» МОУ СШ № 2 рп Новоспасское приобрело спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму 344 718,00 руб. Контракт на поставку товара № 39 от 09.09.2022г. заключен с ООО «Чемпион» ИНН 6325047884. В ходе контрольного мероприятия проведен осмотр спортивного зала и помещений, в которых выполнен ремонт (Акт контрольного обмера (осмотра) б/н от 18.05.2023г.). Осмотром установлено, что приобретенное спортивное оборудование и инвентарь присутствуют в полном объеме, и соответствуют перечню, указанному в товарной накладной к Контракту № 64 от 12.10.2022г.

**Проверка состояния и ведения бухгалтерского учета при реализации национального проекта:**

***Проверка первичных учетных документов.***

В ходе проверки первичных учетных документов нарушения не выявлены.

***Банковские операции.***

При проверке операций с безналичными денежными средствами нарушения не выявлены.

***Учет основных средств и материальных запасов.***

При проверке учета основных средств и материальных запасов нарушения не выявлены.

*Приложение на 12 листах*

**Инспектор КСП  
МО «Новоспасский район»**

**А.П. Леонтьева**

**С актом ознакомлены:**

**Директор МОУ СШ № 2  
рп Новоспасское**

**Т.А. Аракчеева**

**Главный бухгалтер**

**О.Н. Рыськова**

**Акт составлен в двух экземплярах,  
один из которых, получил  
Директор МОУ СШ № 2  
рп Новоспасское**

**Т.А. Аракчеева**

**АКТ**  
**контрольного обмера (осмотра)**

рп Новоспасское Ульяновская обл.  
(населенный пункт)

«18» мая 2023 года

В соответствии с п. 2.4. Плана работы Контрольно-счётной палаты МО «Новоспасский район» на 2023 год, утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счётной палаты МО «Новоспасский район» № 6-п от 29.12.2022г.

(пункт плана работы контрольно-счётного органа, иные основания для проведения контрольного мероприятия, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом о контрольно-счётном органе)

проводится контрольное мероприятие

«Проверка расходования бюджетных средств в ходе реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя школа № 2 р. п. Новоспасское»

(наименование контрольного мероприятия)

на объекте Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 р. п. Новоспасское

(наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе контрольного мероприятия сотрудниками КСП МО «Новоспасский район» в присутствии Директора МОУ СОШ №2 рп Новоспасское — Арахгеевой Т.А.; Индивидуального предпринимателя (подрядчик) — Артамонова Е.А.; Главного бухгалтера МОУ СОШ №2 рп Новоспасское — Рыськовой О.Н.

(должность, фамилия и инициалы лиц, принимающих участие в проведении контрольного обмера (осмотра))

составлен настоящий акт контрольного обмера (осмотра) на

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 рп Новоспасское

(наименование объекта)

В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:

Проведён осмотр помещений МОУ СОШ №2 рп Новоспасское по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, рп Новоспасское, ул. Мира, д. 37.

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» осуществлялся текущий ремонт помещений: спортивный зал; мужская раздевалка; женская раздевалка; входная группа спортивного зала.

Ремонтные работы выполнены на общую сумму 2.584.530<sup>95</sup> руб. Подрядчиком при ремонте являлся ИП Артамонов Евгений Александрович ИНН 470317854913.

Кроме того, осуществлена закупка спортивного оборудования, спортивного инвентаря на сумму 344.718<sup>00</sup> руб. (Поставщик — ООО «Чемпион» ИНН 6325047884.)

1. Ремонт помещений спортивного зала осуществлен в рамках исполнения Контрактов №12 от 27.06.2022г., №17 от 30.06.2022г.

Исполнитель КСП

Левитская АПОЖ

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

2. Ремонт женской и мужской раздевалок осуществлен в рамках исполнения Контракта № 16 от 30.06.2022г.;

3. Ремонт входной группы спортивного зала осуществлен в рамках исполнения Контракта № 15 от 30.06.2022г.

В ходе осмотра отремонтированных помещений расхождений с данными Актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) не установлены.

Осмотром установлено, что спортивный инвентарь, оборудование, приобретённые у ООО "Чемпион" по контракту на поставку товара от 09.09.2022г. № 39 присутствуют в полном объёме и соответствующим перечню, указанному в товарной накладной № 64 от 12.10.2022г.

Инспектор 1097  
Лесиньва А.П.

КОПИЯ  
ВЕРНА



Приложение: на 9 л.

**ПОДПИСИ:**

Участники контрольного мероприятия:

Председатель КСП МО  
«Новоспасский район»  
(должность)

личная подпись

Гусева Н.Ю.  
инициалы, фамилия

Инспектор КСП МО  
«Новоспасский район»  
(должность)

личная подпись

Леонтьева А.П.  
инициалы, фамилия

Представители

*СП*

(должность)

личная подпись

Артамонов Е.А.  
инициалы, фамилия

Директор МОУ СШ № 2  
(должность)

личная подпись

Артamonov E.A.  
инициалы, фамилия

Гл. бухгалтер МОУ СШ № 2

Гусева Н.Ю.  
инициалы, фамилия

**КОПИЯ  
ВЕРНА**


Инспектор КСП  
Леонтьева А.П.

Текущий ремонт спортивного зала в МОУ СШ № 2 рп Новоспасское Ульяновской области  
(Контракт на выполнение работ от 27.06.2022г. № 12)

Подрядчик: ИП Артамонов Евгений Александрович ИНН 470317854913

№ п/п	Наименование (пункт Акта КС-2)	ед. измерен ия	Акт КС-2	Установлен о при осмотре	Отличие, примечание
<b>АКТ-1 от 20.09.2022</b>					
1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами (п. 2)	шт.	12	12	-
2	Светодиодный прожектор gauss led 100w ip65 (п. 3)	шт.	12	12	-
3	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16мм (п. 8)	кв.м	7	7	-
4	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород (п. 10)	куб.м.	0,07	0,07	-
<b>АКТ-2 от 25.11.2022</b>					
5	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, 2,5 кв.м. (п. 5)	шт.	1	1	-
6	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, 3 кв.м. (п. 6)	шт.	1	1	-
7	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (п. 7)	шт.	2	2	-
8	Облицовка стен протектором (п. 8)	кв.м	88,8	88,8	-
9	Стеновой протектор ПРОФИ 20 мм (ПВХ-ткань) (п. 11)	шт.	74	74	-
10	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках (п. 12)	кв.м	161	161	-
11	Линолеум LG Multi 6.0 (п.13)	кв.м	164,22	164,22	-
12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (п.18)	кв.м	44	44	-

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Инспектор КСН  
Левицова А.П. 

Подрядчик: ИП Артамонов Евгений Александрович ИНН 470317854913

№ п/п	Наименование (пункт Акта КС-2)	ед. измерения	Акт КС-2	Установлено при осмотре	Отличие, примечание
	<b>Пол</b>				
1	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 кв.м. (п. 1)	кв.м	161,0	161,0	—
2	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3 (п. 11)	кв.м	164,22	164,22	—

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Министр КСР  
Акутеева А.П. *[Подпись]* 2

№ п/п	Наименование (пункт Акта КС-2)	ед. измерен ия	Акт КС-2	Установлен о при осмотре	Отличие, примечание
<b>Пол</b>					
1	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (п. 6)	кв.м	46,58	46,58	—
2	Плитки керамогранитные размером 300*300*8мм (п. 10)	кв.м	47,51	47,51	—
3	Устройство плинтусов из плиток керамических (п. 8)	м	34,18	34,18	—
<b>Стены</b>					
4	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (п. 20)	кв.м	102,5	102,5	—
5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен (п. 27)	кв.м	102,5	102,5	—
<b>Потолок</b>					
6	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (п. 35)	кв.м	45,85	45,85	—
7	Светильник светодиодный 595*595 (п. 39)	шт.	7	7	—
<b>Двери</b>					
8	Установка противопожарных дверей однопольных глухих (п. 43)	кв.м	4,8	4,8	—
9	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60 (п. 44)	шт.	3	3	—
10	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (п.45)	шт.	3	3	—

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Исполнитель КС  
Артамонов А.П.

Ремонт раздевалок спортивного зала в МОУ СШ № 2 рп Новоспасское Ульяновской области (Контракт на выполнение работ от 30.06.2022г. № 16)  
 Подрядчик: ИП Артамонов Евгений Александрович ИНН 470317854913

№ п/п	Наименование (пункт Акта КС-2)	ед. измерения	Акт КС-2	Установлено при осмотре	Отличие, примечание
<b>Раздевалка женская</b>					
<b>Пол</b>					
1	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (п. 7)	кв.м	16,6	16,6	—
2	Плитки керамогранитные размером 300*300*8мм (п. 11)	кв.м	16,932	16,9	—
3	Устройство плинтусов из плиток керамических (п. 13)	м	17,6	17,6	—
<b>Стены</b>					
4	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (п. 21)	кв.м	3,0	3,0	—
5	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (п. 22)	кв.м	3,0	3,0	—
6	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (п. 25)	кв.м	48,8	48,8	—
7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен (п. 32)	кв.м	48,8	48,8	—
8	Смена выключателей (п. 35)	шт.	3	3	—
<b>Потолок</b>					
9	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (п. 38)	кв.м	16,6	16,6	—
10	Светильник светодиодный 595*595 (п. 42)	шт.	3	3	—
<b>Двери</b>					
11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проемов до 3 кв.м. (п. 47)	кв.м	2,4	2,4	—
<b>Раздевалка мужская</b>					
<b>Пол</b>					
12	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (п. 57)	кв.м	14,47	14,47	—
13	Плитки керамогранитные размером 300*300*8мм (п. 61)	кв.м	14,759	14,7	—
14	Устройство плинтусов из плиток керамических (п. 63)	м	15,3	15,3	—
<b>Стены</b>					
15	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (п. 71)	кв.м	3,0	3,0	—
16	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (п. 72)	кв.м	3,06	3,0	—
17	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен (п. 75)	кв.м	41,9	41,9	—
18	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен (п. 82)	кв.м	41,9	41,9	—
19	Смена выключателей (п. 85)	шт.	1	1	—
<b>Потолок</b>					
20	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (п. 88)	кв.м	14,47	14,47	—
21	Светильник светодиодный 595*595 (п. 92)	шт.	2	2	—
<b>Двери</b>					
22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проемов до 3 кв.м. (п. 97)	кв.м	2,4	2,4	—

Исполнитель КСН  
 Печкина А.А.

КОПИЯ  
 ВЕРНА

Закупка и поставка спортивного оборудования в МОУ СШ № 2 рп Новоспаское Ульяновской области (Контракт на поставку товара от 09.09.2022г. № 39)


Поставщик: ООО «Чемпион» ИНН 6325047884

№ п/п	Наименование	ед. измерения	Товарная накладная № 64 от 12.10.2022г.	Установлен о при осмотре	Отличие, примечание
1	Сетка баскетбольная	шт.	3	3	-
2	Щит баскетбольный тренировочный	шт.	3	3	-
3	Ферма баскетбольная тренировочная	шт.	3	3	-
4	Кольцо баскетбольное тренировочное	шт.	3	3	-
5	Стойки волейбольные пристенные	компл.	1	1	-
6	Сетка волейбольная тренировочная	шт.	1	1	-
7	Стенка гимнастическая	шт.	8	8	-
8	Перекладина навесная универсальная	шт.	3	3	-
9	Скамейка гимнастическая жесткая	шт.	5	5	-
10	Стойка для хранения мячей	шт.	2	2	-
11	Шкаф-локер для инвентаря универсальный	шт.	2	2	-
12	Оборудование для скалодрома с зацепками	компл.	4	4	-
13	Веревка динамическая SMART 10мм	метр	98	98	-
14	Ботинки лыжные NNN р.33	шт.	1	1	-
15	Ботинки лыжные NNN р.34	шт.	1	1	-
16	Ботинки лыжные NNN р.35	шт.	1	1	-
17	Ботинки лыжные NNN р.36	шт.	1	1	-
18	Ботинки лыжные NNN р.37	шт.	2	2	-
19	Ботинки лыжные NNN р.38	шт.	2	2	-
20	Ботинки лыжные NNN р.39	шт.	2	2	-

КОПИЯ  
ВЕРНА

Исполнитель КСЛ  
Леонтьева А. П. 5


Спортивный зал

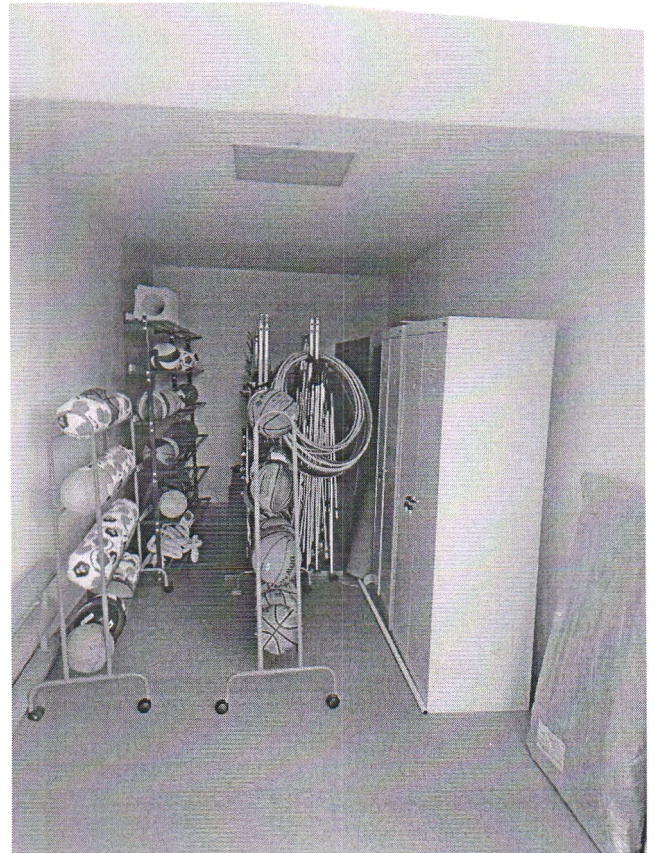

КОПИЯ  
ВЕРНА

Миссияр КСН  
Лосева А.П. 6

Входная группа

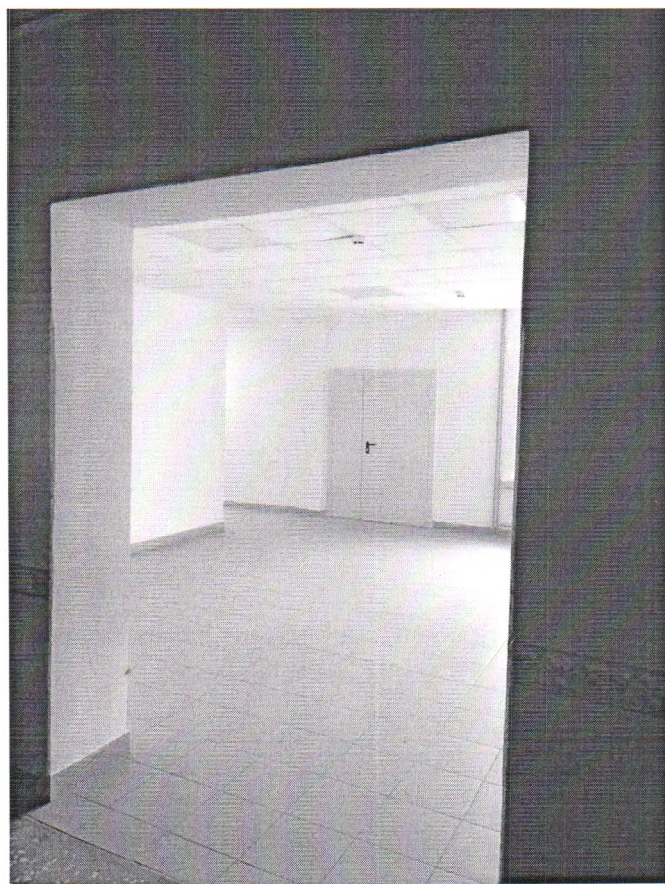


КОПИЯ  
ВЕРНА

Инспектор КДН 7  
Документы АПС



Раздевальня женская

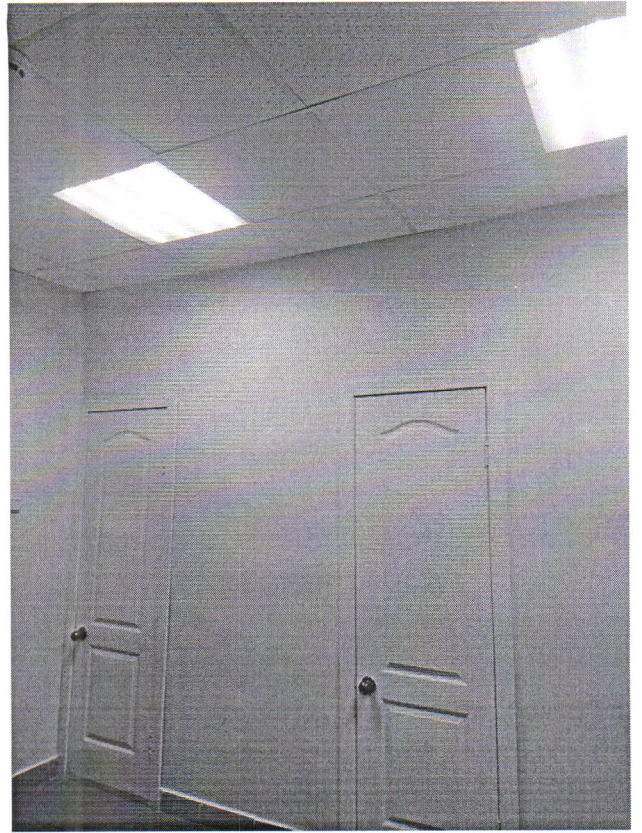

КОПИЯ  
ВЕРНА

Исполнитель КСД  
Асюткина А.Р.



КОПИЯ  
ВЕРНА

Директор КСН  
Леситьева А.В. 9
